



















Id		% completada	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable	05 oct '14	
									D	L
1		23%	Rendición de Cuentas 2014	126 días	mié 05/11/14	mié 29/04/15				
2		100%	Revisión de Cronograma con las Autoridades	1 día	vie 09/01/15	vie 09/01/15	4	Planificación - Subgerencia		
3		100%	Revisión y envío de información Rendición de Cuentas 2014 al MINTEL	2 días	vie 21/11/14	lun 24/11/14	2	Planificación		
4		100%	Memorando para informes Direcciones Nacionales	2 días	mié 07/01/15	jue 08/01/15				
5		100%	Elaboración de memorando para informes jefes provinciales	10 días	mié 07/01/15	mar 20/01/15				
6		100%	Elaboración de oficio de responsables del proceso a los jefes provinciales	1 día	jue 08/01/15	jue 08/01/15				
7		0%	Publicación de información en link de página web	1 día	jue 29/01/15	jue 29/01/15	46	Planificación - Comunicación		
8		10%	Despligue directrices Rendición de Cuentas	67 días	jue 27/11/14	vie 27/02/15				
9		0%	Revisión de formatos de fichas y presentaciones	1 día	lun 12/01/15	lun 12/01/15	2	Planificación - CPCCS		
10		16%	Revisión de información para territorio	60 días	jue 27/11/14	mié 18/02/15	9	Planificación - Subgerencia		
11		100%	Solicitud a las provincias del estado de los compromisos de Rendición de Cuentas 2013	7 días	jue 27/11/14	vie 05/12/14		Planificación - Jefes Provinciales		
12		0%	Revisión de la información a ser solicitada a las provincias	1 día	jue 15/01/15	jue 15/01/15	11	Planificación - Comunicación - Negocios		
13		0%	Requerimiento a los Jefes Provinciales de insumos para RC en territorio	24 días	vie 16/01/15	mié 18/02/15	12	Planificación - Jefes Provinciales		
14		0%	Solicitud para el desplazamiento del equipo	1 día	vie 16/01/15	vie 16/01/15	12	Planificación - Gerencia Estratégica de		
15		0%	Revisión de Agenda para RC en territorio	1 día	lun 19/01/15	lun 19/01/15		Planificación		

Proyecto: Cronograma Ingreso Inf
Fecha: mié 04/02/15

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id		% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable	05 oct '14	
									D	L
16		0%	Video conferencia con los jefes provinciales	1 día	mar 27/01/15	mar 27/01/15		Planificación - Jefes Provinciales		
17		0%	Envío de invitaciones a Provincias	2 días	lun 26/01/15	mar 27/01/15		Comunicación		
18		0%	Recepción de presentación de provincias	1 día	vie 30/01/15	vie 30/01/15		Comunicación		
19		0%	Envío de presentaciones revisadas (finales)	6 días	lun 02/02/15	lun 09/02/15	18	Planificación		
20		0%	Rendición de Cuentas en territorio	10 días	lun 09/02/15	vie 20/02/15	19			
21		0%	Sto Domingo - Sto Domingo	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15		Planificación		
22		0%	Orellana - Coca	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15		Planificación		
23		0%	Sucumbios - Lago Agrio	1 día	lun 09/02/15	lun 09/02/15		Planificación		
24		0%	Zamora Chimchipe - Zamora	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15		Planificación		
25		0%	Loja - Loja	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15		Planificación		
26		0%	Bolívar - Guaranda	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15		Planificación		
27		0%	Chimborazo - Riobamba	1 día	mar 10/02/15	mar 10/02/15		Planificación		
28		0%	Tungurahua - Ambato	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15	29	Planificación		
29		0%	Cotopaxi - Latacunga	1 día	mié 11/02/15	mié 11/02/15		Planificación		
30		0%	Carchi - Tulcán	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15		Planificación		
31		0%	Imbabura - Ibarra	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15		Planificación		
32		0%	Galápagos - Santa Cruz	1 día	vie 27/02/15	vie 27/02/15		Planificación		
33		0%	Manabí - Portoviejo	1 día	vie 13/02/15	vie 13/02/15		Planificación		
34		0%	Napo - Tena	1 día	mié 18/02/15	mié 18/02/15		Planificación		
35		0%	Pastaza - Puyo	1 día	mié 18/02/15	mié 18/02/15		Planificación		
36		0%	Morona Santiago - Macas	1 día	jue 19/02/15	jue 19/02/15		Planificación		
37		0%	Azuay - Cuenca	1 día	vie 13/02/15	vie 13/02/15		Planificación		




Proyecto: Cronograma Ingreso Inf
Fecha: mié 04/02/15



















Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id	%	completada	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable	05 oct '14	
									D	L
38		0%	Cañar - Azoguez	1 día	jue 19/02/15	jue 19/02/15		Planificación		
39		0%	Los Ríos - Babahoyo	1 día	vie 20/02/15	vie 20/02/15		Planificación		
40		0%	Guayas - Guayaquil	1 día	jue 12/02/15	jue 12/02/15		Planificación		
41		0%	Santa Elena - Salinas	1 día	vie 20/02/15	vie 20/02/15		Planificación		
42		0%	Esmeraldas - Esmeraldas	1 día	lun 23/02/15	lun 23/02/15		Planificación		
43		0%	El Oro - Machala (Santa Rosa)	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15		Planificación		
44		19%	Rendición de Cuentas Nacional	89 días	mié 05/11/14	lun 09/03/15				
45		0%	Revisión de Compromisos RC Nacional	1 día	mié 05/11/14	mié 05/11/14		Planificación		
46		0%	Conformación del equipo de rendición de cuentas	3 días	lun 29/12/14	mié 31/12/14	45	Planificación		
47		62%	Solicitud de Informes de Gestión a las Direcciones Nacionales	13 días	mié 07/01/15	vie 23/01/15	3	Gerencia General		
48		0%	Evaluación de la gestión	3 días	lun 26/01/15	mié 28/01/15	47	Planificación		
49		80%	Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas	4 días	mar 17/02/15	vie 20/02/15	46	Planificación		
50		0%	Solicitud de listado de personas que asistirán a la Presentación de rendición de Cuentas Matriz	6 días	mié 28/01/15	mié 04/02/15	46	Ventas,Comunicación		
51		0%	Creación de link en Página web para Rendición de Cuentas	9 días	lun 05/01/15	jue 15/01/15	46	Tecnología		
52		0%	Envío de listado de personas que asistiran a la presentación de Rendición de cuentas	2 días	jue 05/02/15	vie 06/02/15	50	Comunicación,Planificación		
53		0%	Revisión de Información	1 día	lun 26/01/15	lun 26/01/15	47	Planificación		
54		0%	Revisión de Logística	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15	53	Planificación - Comunicació		

Proyecto: Cronograma Ingreso Inf
Fecha: mié 04/02/15

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	


Id		% completado	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Responsable	05 oct '14	
									D	L
55	 	0%	Informe preliminar y logística para eventos de las Unidades de Administración Financiera (UDAF).	5 días	vie 27/02/15	jue 05/03/15	53	Comunicación,Planificaciór		
56	 	0%	Elaboración de presentación RC Nacional	5 días	jue 26/02/15	mié 04/03/15	54	Comunicación		
57		0%	Revisión de presentación	1 día	jue 05/03/15	jue 05/03/15	56	Planificación - Comunicaciór		
58		0%	Seguimiento de logística	1 día	vie 06/03/15	vie 06/03/15	57	Planificación - Comunicaciór		
59	 	0%	Difusión del informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	2 días	vie 06/03/15	lun 09/03/15	55	Planificación - Comunicaciór		
60	 	0%	Presentación RC Nacional	1 día	lun 09/03/15	lun 09/03/15	58	Planificación - Comunicaciór		
61		0%	Consolidación de Sistematización de territorio y Nacional	2 días	mar 10/03/15	mié 11/03/15	60	Planificación		
62		0%	Entrega de insumos para la Nacional	1 día	lun 02/02/15	lun 02/02/15		Direcciones Nacionales		
63		0%	Revisión de presentación con las autoridades	1 día	mié 25/02/15	mié 25/02/15		Gerencia General - Comunicaciór		
64	 	0%	Evento Rendición de Cuentas	1 día	mar 03/03/15	mar 03/03/15		Comunicación		
65		0%	Carga de información en la Pagina del CPSCC	1 día	lun 06/04/15	lun 06/04/15		Planificación		
66		0%	Envío formal del proceso de Rendición de Cuentas al CPCCS y al MINTEL	1 día	mar 07/04/15	mar 07/04/15	61	Planificación		
67		0%	Entrega de respaldos a la Gerencia Estratégica de Proyectos y Planificación	1 día	mié 29/04/15	mié 29/04/15	66	Planificación		

Proyecto: Cronograma Ingreso Inf Fecha: mié 04/02/15	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

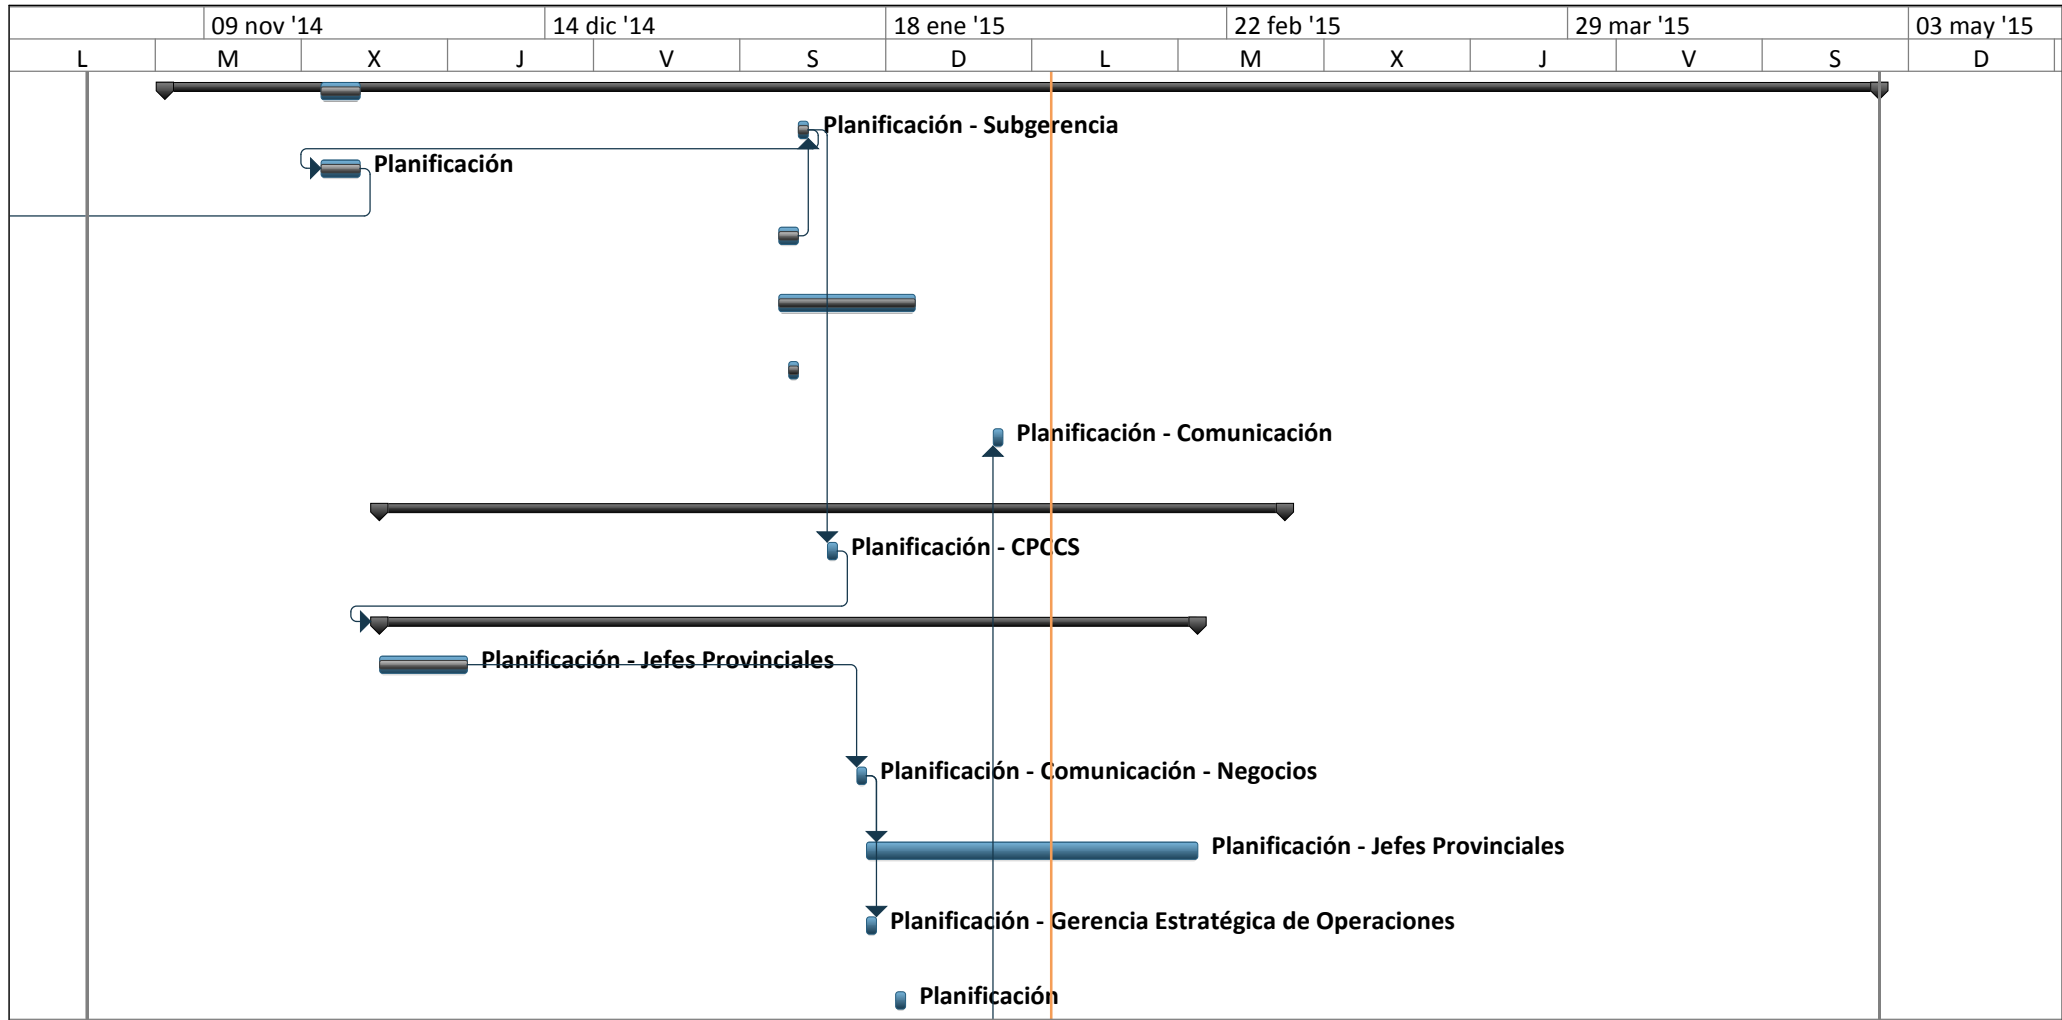


Proyecto: Cronograma Ingreso Inf
 Fecha: mié 04/02/15

Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
División		Tarea inactiva		Resumen manual	
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

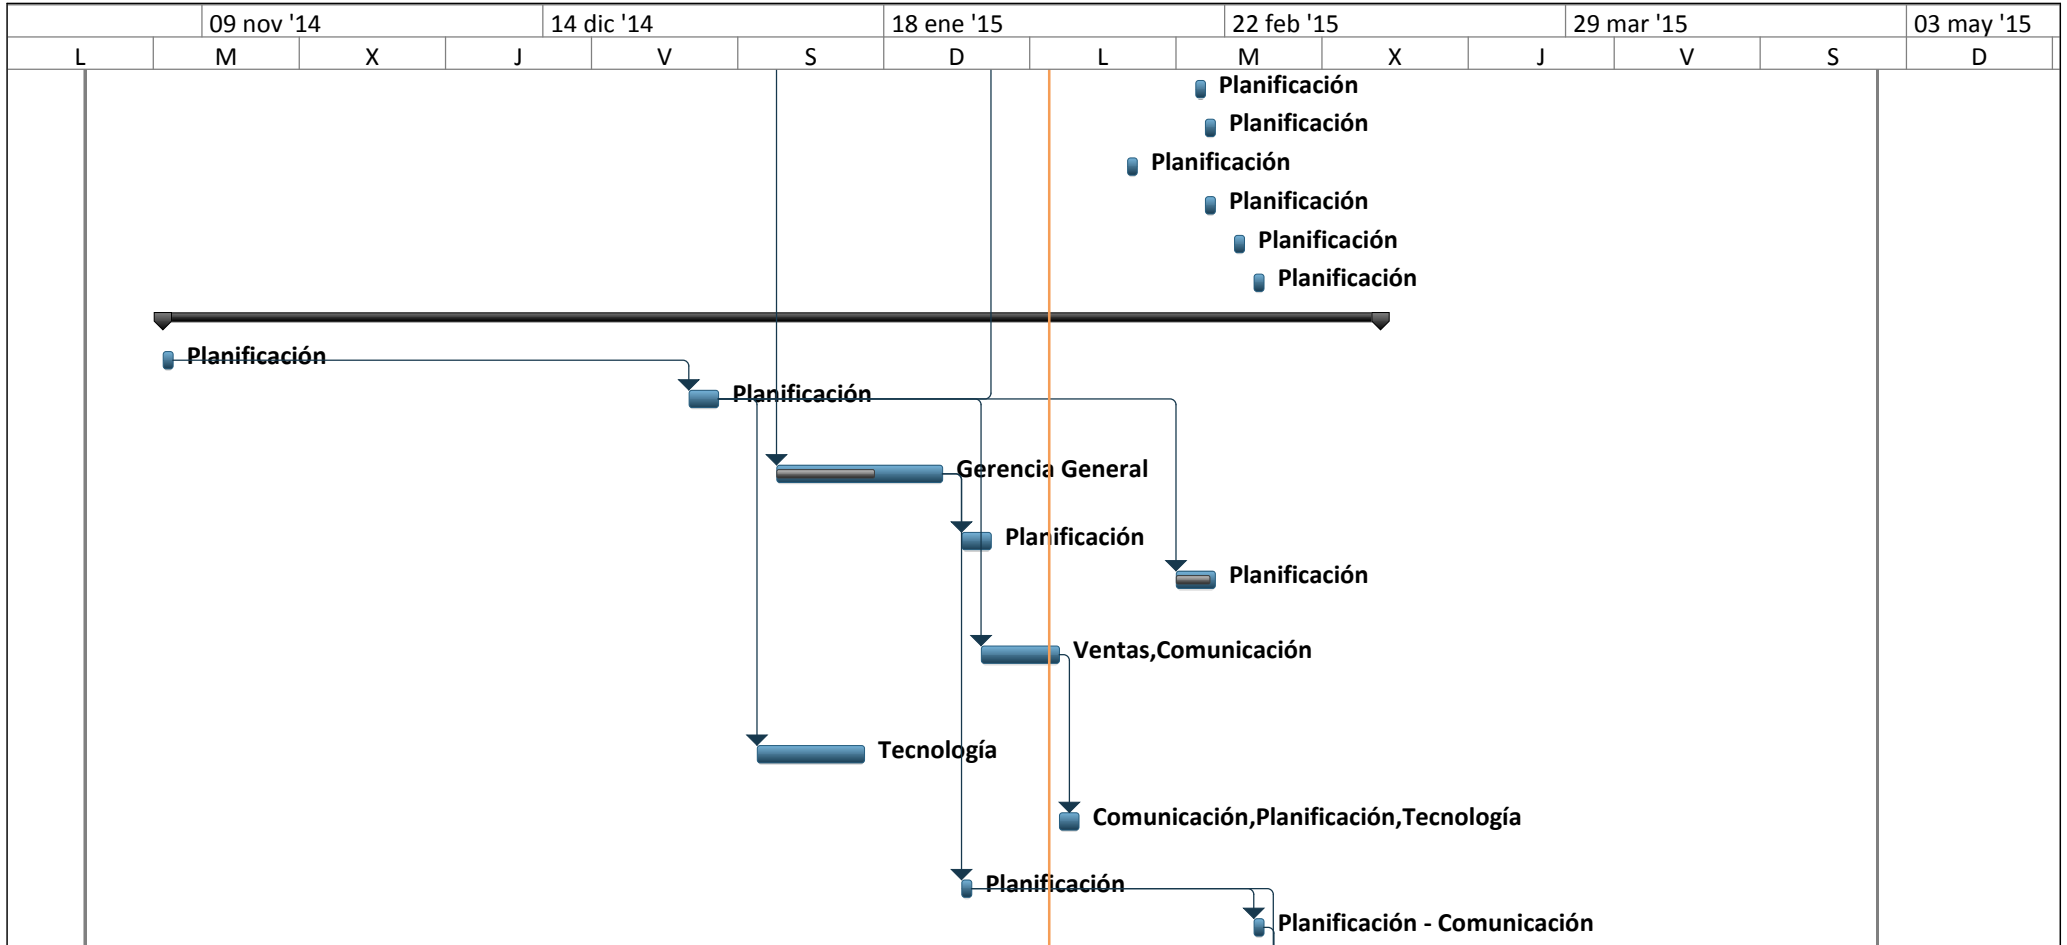

Proyecto: Cronograma Ingreso Inf Fecha: mié 04/02/15	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

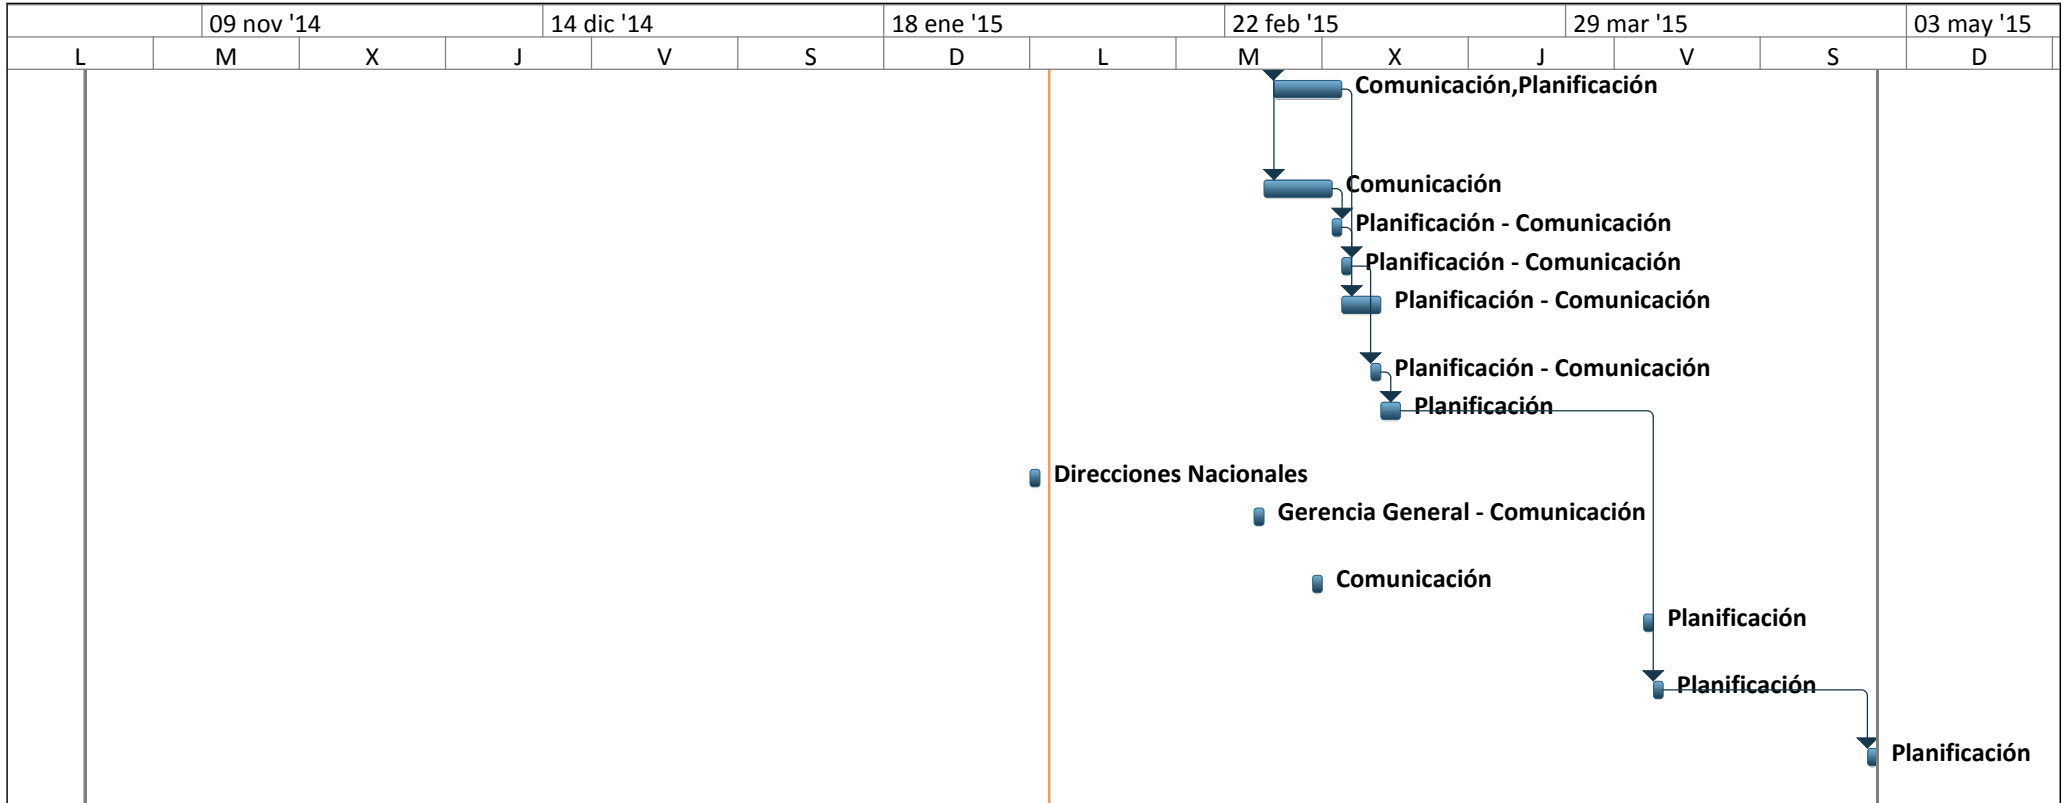

Proyecto: Cronograma Ingreso Inf Fecha: mié 04/02/15	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	
